
OPSCHRIFT

Vergadering van 25 april 2016

Besluit nummer: 2016_GR_00306

Onderwerp:

Samenwerkingsovereenkomst betreffende de wegen- en rioleringswerken in de Moerstraat op het grondgebied van de gemeente Nevele, de stad Deinze en de stad Gent - Goedkeuring

Beknopte samenvatting:

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst met TMVW, de gemeente Nevele, de Stad Deinze betreffende het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Moerstraat op het grondgebied van de gemeente Nevele, de stad Deinze en de stad Gent.

De opdracht wordt in het algemeen belang samengevoegd en de TMVW wordt aangeduid om in hun gezamenlijke naam op te treden dit zowel voor de uit te voeren werken, voor de aanstelling van de veiligheidscoördinator-ontwerp als voor de veiligheidscoördinator-verwezenlijking.

(kenmerk: TDWCOL2013/40 - DOM-061/10/179-Z)

Bevoegd: Filip Watteeuw

Bestemd voor:

- Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw

DE GEMEENTERAAD

AANHEF

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, § 1.

De beslissing wordt genomen op grond van:

- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 2;
- De Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006, artikel 38.

Bijgevoegde bijlage(n):

- Samenwerkingsovereenkomst
- Financiële bijlage (informatief)

MOTIVERING

De TMVW, de gemeente Nevele, de Stad Deinze en de Stad Gent voorzien gezamenlijk over te gaan tot het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Moerstraat op het grondgebied van de gemeente Nevele, de stad Deinze en de stad Gent.

Hierbij wordt het door de TMVW opgemaakt voorstel van samenwerkingsovereenkomst waarbij de TMVW, de gemeente Nevele, de Stad Deinze en de Stad Gent voorzien om gezamenlijk wegen- en rioleringswerken in de Moerstraat op het grondgebied van de gemeente Nevele, de stad Deinze en de stad Gent uit te voeren, voor goedkeuring voorgelegd.

In deze overeenkomst beslissen de TMVW, de gemeente Nevele, de Stad Deinze en de Stad Gent onderstaande opdracht in het algemeen belang samen te voegen en de TMVW aan te duiden om in gezamenlijke naam op te treden als “leidinggevend bestuur”, dit zowel voor de uit te voeren werken, voor de aanstelling van de veiligheidscoördinator-ontwerp als voor de veiligheidscoördinator-verwezenlijking.

De gemeente Nevele wenst de volgende werken uit te voeren:

- de heraanleg van de wegenis in de Moerstraat pro rata het gedeelte gelegen op het grondgebied van de gemeente Nevele.

De Stad Deinze wenst de volgende werken uit te voeren:

- de heraanleg van de wegenis in de Moerstraat pro rata het gedeelte gelegen op het grondgebied van de stad Deinze.

De Stad Gent wenst de volgende werken uit te voeren:

- de heraanleg van de wegenis in de Moerstraat pro rata het gedeelte gelegen op het grondgebied van de stad Gent.

De TMVW wenst de volgende werken uit te voeren:

- de aanleg van DWA-riolering in de Moerstraat voor het saneren van de groene clusters gelegen op het grondgebied van Nevele, Deinze en Gent
- de heraanleg van de kopmuren en profilering van de grachten langs de Moerstraat
- de aanleg van RWA-riolering waar geen grachten gelegen zijn.

Deelname in de kosten door de medefinanciers:

De gemeente Nevele verbindt er zich toe de volgende werken te haren laste te nemen op haar grondgebied:

- de heraanleg van de wegenis in de Moerstraat.

De Stad Deinze verbindt er zich toe de volgende werken te haren laste te nemen op haar grondgebied

- de heraanleg van de wegenis in de Moerstraat.

De Stad Gent verbindt er zich toe de volgende werken te haren laste te nemen op haar grondgebied

- de heraanleg van de wegenis in de Moerstraat.

De TMVW verbindt er zich toe de volgende werken te haren laste te nemen:

- de aanleg van DWA-riolering in de Moerstraat voor het saneren van de groene clusters gelegen op het grondgebied van Nevele, Deinze en Gent
- de heraanleg van de kopmuren en profilering van de grachten langs de Moerstraat
- de aanleg van RWA-riolering waar, geen grachten gelegen zijn
- de kosten ten laste van TMVW worden verdeeld over de verschillende Aquario-budgetten van Nevele, Deinze en Gent pro rata het grondgebied waar de riolering en/of grachten gelegen zijn.

**Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen
Beslist het volgende:**

BESLISSING

Artikel 1:

Keurt goed de bij dit besluit gevoegde en er integraal deel van uitmakende samenwerkingsovereenkomst met TMVW, de gemeente Nevele en de Stad Deinze, betreffende het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Moerstraat op het grondgebied van de gemeente Nevele, de stad Deinze en de stad Gent, waarbij de opdracht in het algemeen belang wordt samengevoegd en de TMVW wordt aangeduid om in hun gezamenlijke naam op te treden dit zowel voor de uit te voeren werken, voor de aanstelling van de veiligheidscoördinator-ontwerp als voor de veiligheidscoördinator-verwezenlijking.

BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT

Departement Publieke Ruimte - Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen

Dit besluit kadert in volgende activiteit: AC34912 Uitvoering en toezicht van werken door externe aannemers, dienstverleners of derden

Visum van de financieel beheerder:

Visum verleend met visum nummer 2016500055.

Financiële informatie:

Voorgestelde uitgaven:

Volgende budgetten zijn nodig en beschikbaar:

Budgetplaats	Budget	Subsidie	MJP	MJP	totaal
	Positie	Code	2017	2018	
349125300	2240000		x	x	

Verwachte ontvangsten:
niet van toepassing

BIJLAGEN DIE INTEGRAAL DEEL UITMAKEN VAN HET BESLUIT

- Samenwerkingsovereenkomst

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

BETREFFENDE DE WEGENIS- EN RIOLERINGSWERKEN IN DE MOERSTRAAT OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE NEVELE, STAD DEINZE EN STAD GENT

TUSSEN: De **TUSSENGEMEENTELIJKE MAATSCHAPPIJ DER VLAANDEREN VOOR WATERVOORZIENING**, in 't kort de TMVW, intercommunale, b.v. onder de vorm van een c.v.b.a., met zetel te 9000 Gent, Stropstraat 1, hier ,vertegenwoordigd door de voorzitter van haar raad van bestuur, Martine De Regge, en haar algemeen directeur, Ludy Modderie, ON 0200068636, hierna genoemd "TMVW"

EN : Het **gemeentebestuur van NEVELE**, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, voor wie optreedt de heer Johan CORNELIS, als burgemeester, en *mevr. Joke Meesters*, als gemeentesecretaris, hierna genoemd "de gemeente Nevele"

EN: Het **stadsbestuur van DEINZE**, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, voor wie optreedt de heer *Jam Vermeulen*, als burgemeester, en mevrouw Stefanie DE VLIAGER, als stadssecretaris, hierna genoemd "de stad Deinze"

EN: Het **stadsbestuur van GENT**, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, voor wie optreedt de heer Daniel TERMONT, als burgemeester, en de heer Paul TEERLINCK, als stadssecretaris, hierna genoemd "de stad Gent"

Hierna afzonderlijk genoemd "partij" en gezamenlijk "partijen";

Aangezien de gemeente Nevele de volgende werken wenst uit te voeren:

- De heraanleg van de wegenis in de Moerstraat pro rata het gedeelte gelegen op het grondgebied van de gemeente Nevele

Aangezien de stad Deinze de volgende werken wenst uit te voeren:


- De heraanleg van de wegenis in de Moerstraat pro rata het gedeelte gelegen op het grondgebied van de stad Deinze

Aangezien de stad Gent de volgende werken wenst uit te voeren:

- De heraanleg van de wegenis in de Moerstraat pro rata het gedeelte gelegen op het grondgebied van de stad Gent

Aangezien de TMVW de volgende werken wenst uit te voeren:

- De aanleg van DWA-riolering in de Moerstraat voor het saneren van de groene clusters gelegen op het grondgebied van Nevele, Deinze en Gent.
- De heraanleg van de kopmuren en profilering van de grachten langs de Moerstraat
- De aanleg van RWA-riolering waar geen grachten gelegen zijn



Aangezien de partijen van oordeel zijn dat de werken en de opdracht in het algemeen belang worden samengevoegd.

WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT :

ARTIKEL 1 – Aanbestedende overheid

De gemeente Nevele, de TMVW, de stad Deinze en de stad Gent beslissen de in de overweging beschreven werken in het algemeen belang, samen te voegen en de TMVW aan te duiden om in hun gezamenlijke naam bij de gunning en de uitvoering van de opdracht als aanbestedende overheid op te treden, overeenkomstig artikel 19 van de wet van 24 december 1993, en dit zowel voor de uit te voeren werken, voor de aanstelling van de veiligheidscoördinator-ontwerp als voor de veiligheidscoördinator-verwezenlijking.

ARTIKEL 2 – Deelname in de kosten door de medefinanciers

§1. Rekening houdend met de uitgaven die nodig zijn om de verschillende onderdelen van het project te kunnen realiseren, ten voordele van elke partij, worden de uit te voeren werken als volgt ten laste genomen:

De gemeente Nevele verbindt er zich toe de volgende werken te haren laste te nemen op haar grondgebied:

- De heraanleg van de wegenis in de Moerstraat

De stad Deinze verbindt er zich toe de volgende werken te haren laste te nemen op haar grondgebied

- De heraanleg van de wegenis in de Moerstraat

De stad Gent verbindt er zich toe de volgende werken te haren laste te nemen op haar grondgebied

- De heraanleg van de wegenis in de Moerstraat

De TMVW verbindt er zich toe de volgende werken te haren laste te nemen:

- De aanleg van DWA-riolering in de Moerstraat voor het saneren van de groene clusters gelegen op het grondgebied van Nevele, Deinze en Gent.
- De heraanleg van de kopmuren en profilering van de grachten langs de Moerstraat
- De aanleg van RWA-riolering waar geen grachten gelegen zijn
- De kosten ten laste van TMVW worden verdeeld over de verschillende Aquario-budgetten van Nevele, Deinze en Gent pro rata het grondgebied waar de riolering en/of grachten gelegen zijn.

§2. De hoger vermelde kosten zijn inclusief de hiernavolgende bepalingen, zonder dat de hiernavolgende lijst enig beperkend karakter heeft:

1. de uitgaven voor sonderingen, topografische verrichtingen, ontledingen, bodem- en materiaalproeven;

2. de uitgaven voor het rechtstreekse toezicht op het bouwterrein en/of in de fabrieken;
3. de uitgaven voor de werken bij aanneming waarvan het bedrag bepaald wordt door de goedgekeurde inschrijving en de gebeurlijke verrekeningen;
4. de uitgaven voor bijkomende werken (niet opgenomen in de aanbestedingsdocumenten) en meerwerken die tijdens de uitvoering van de aanneming nodig zouden worden geacht. Ingeval van bijkomende werken die geheel of gedeeltelijk ten laste vallen van één of meerdere van de andere betrokken besturen stelt de leidende ambtenaar een verrekening op die voor goedkeuring wordt overgemaakt aan deze besturen. De leidende ambtenaar rechtvaardigt de noodzakelijkheid van de werken, de voorgestelde eenheidsprijzen en de eventueel te verlenen bijkomende uitvoeringstermijnen;
5. de heraanbestedingskosten wegens het in gebreke blijven van de aannemer in geval die kosten bij de aannemer niet meer zou kunnen terugvorderen. Deze heraanbestedingskosten zijn voor iedere partij forfaitair vastgesteld op 1% van het aanvangsbedrag van de nieuwe aannemingsovereenkomst doch zullen niet meer dan vijfduizend (5.000) EUR bedragen.

§3. Kosten die niet kunnen toegewezen worden aan één van de betrokken partijen doch die noodzakelijk zijn voor de realisatie van het project, worden door de financierende partijen gedragen a rato van hun aandeel in de totale kostprijs van het project.

ARTIKEL 3 – Studie en vergunningen

§ 1 Alle partijen staan, ook financieel, in voor de studie en de goedkeuring van het ontwerp voor het deel van de opdracht dat te laste van hen is. Zij nemen tegenover de aanbestedende overheid de volledige verantwoordelijkheid voor dit ontwerp, de administratieve bepalingen en de technische bepalingen die zij ter zake in het bestek laat inlassen en alle wijzigingen of bijwerken die tijdens de uitvoering van de opdracht noodzakelijk blijken en verband houden met de uitvoering van de werken ten laste van haar.

Onder "bijwerken of wijzigingen" wordt ook verstaan de maatregelen en werken voor het saneren van bodemverontreiniging aangetroffen in de loop van de uitvoering van de opdracht. Elke partij draagt bij in de saneringskosten in de mate dat de bodemsanering betrekking heeft op het deel van de werken die voor haar rekening zijn.

De coördinatie en de redactie van het samengestelde dossier gebeurt door de TMVW.

§ 2 Elke partij staat in voor het verwerven van de vergunningen die nodig zijn voor de uitvoering van de werken te haren laste. Desgevallend worden de vergunningsaanvragen gebundeld door de aanbestedende overheid.

§ 3 De aanbestedende overheid stelt overeenkomstig de overheidsopdrachtenwetgeving en de reglementering met betrekking tot de veiligheid op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, 1 gemeenschappelijke veiligheidscoördinator-ontwerp aan die, tijdens de fase van het ontwerp van de werken die het voorwerp uitmaken van onderhavige overeenkomst (hierna genoemd "de samengevoegde opdrachten"), de veiligheidscoördinatie zal uitvoeren.

De aanstelling van de veiligheidscoördinator-ontwerp wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst afgesloten tussen en ondertekend door alle partijen en de veiligheidscoördinator-ontwerp (natuurlijke persoon).

Alle partijen zien er op toe dat de veiligheids-coördinator-ontwerp zijn/haar opdrachten, samenhangend met hun aandeel in de samengevoegde opdrachten, te allen tijde volledig en adequaat vervult, dat hij/zij betrokken wordt bij alle etappes van de werkzaamheden betreffende de uitwerking, wijzigingen en aanpassingen van het ontwerp van het bouwwerk en dat hij/zij alle informatie krijgt die nodig is voor de uitvoering van zijn/haar opdrachten. Alle partijen zullen de door hen aangestelde ontwerpers hiertoe contractueel verplichten.

De aanbestedende overheid ziet er op toe dat de veiligheidscoördinator-ontwerp bij het einde van zijn/haar opdracht een exemplaar van het veiligheidsplan, het coördinatiedagboek en het postinterventiedossier met betrekking tot de samengevoegde opdrachten overmaakt aan alle partijen.

De kosten verbonden aan de aanstelling en de uitvoering van de taken van de veiligheidscoördinator-ontwerp worden evenredig verdeeld tussen alle partijen op basis van het geraamde aandeel van elk der partijen in de samengevoegde opdrachten.

§ 4 In het geval door de aanbestedende overheid in samenspraak met de ontwerpers van de andere partijen besloten wordt een milieuhygiënisch bodemonderzoek uit te voeren, zullen de kosten van dit onderzoek evenredig tussen de partijen worden verdeeld op basis van het geraamde aandeel van elk der partijen in de samengevoegde opdrachten.

ARTIKEL 4 - Bestek

De werken ten laste van de verschillende partijen worden in het bestek en de opmetingen telkens onder een afzonderlijk deel vermeld en maken het voorwerp uit van afzonderlijke door de aannemer op te stellen vorderingsstaten. Inzonderheid in artikel 15 van de administratieve bepalingen van het bijzonder bestek zal de speciale aandacht van de aannemer hierop gevestigd worden.

Het bestek wordt door de TMVW ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeente Nevele, de stad Deinze en de stad Gent.

ARTIKEL 5 - Gunning

Als aanbestedende overheid schrijft de TMVW de gunningsprocedure uit, staat in voor de opening van de inschrijvingen, maakt het gunningsverslag op en wijst de opdracht toe. Hierbij wordt wel rekening gehouden met het feit dat de aanneming één ondeelbaar geheel uitmaakt en dat alle werken dus moeten toevertrouwd worden aan de laagste regelmatige bieder voor de totaliteit van de werken (alle delen samen).

De aanbestedende overheid zal de kennisgeving van de goedkeuring van de gezamenlijke werken slechts betekenen nadat alle partijen hebben ingestemd met het gunningsvoorstel en op ondubbelzinnige wijze een verklaring hebben afgelegd dat zij akkoord gaan met het gedeelte van de werken ten laste van hen en dat zij voor de betaling ervan de nodige financiële middelen hebben voorzien.

Desnoods verzoekt de aanbestedende overheid de aannemers om een verlenging van de gestanddoeningstermijn van de inschrijvingen in afwachting van het akkoord van de andere partij. In elk geval zal zij dit akkoord geven binnen de twee maanden nadat ze hierom werden verzocht. Zo niet kan de partij die verantwoordelijk is voor de vertraging de financiële gevolgen ervan ten laste gelegd worden.

ARTIKEL 6 - Borgtocht

De aanbestedende overheid verzoekt de aannemer de borgtocht te stellen. Deze heeft betrekking op de totaliteit van de werken. De aanbestedende overheid kan dus eventueel beslag leggen op de ganse borgtocht, maar zal die uiteraard geheel of gedeeltelijk aanwenden ten voordele van deze partij en ten aanzien van wie de aannemer tekort geschoten is en dit in verhouding tot de werkelijke kostprijs.

ARTIKEL 7 - Leiding van de werken.

§ 1 De leiding van de werken gebeurt op kosten van de aanbestedende overheid. De aanbestedende overheid duidt bijgevolg de leidend ambtenaar aan. De leidend ambtenaar neemt de leiding van de werken waar. Dit betekent dat hij alleen gemachtigd is om - voor alle werken, wie ze ook ten laste neemt - opdrachten te geven aan de aannemer, proces-verbaal van ingebrekestelling op te maken, proces-verbaal van voorlopige en definitieve oplevering van de werken op te maken, de werken te schorsen, vorderingsstaten goed te keuren, verrekeringen op te maken en voor te stellen, eventuele maatregelen van ambtswege voor te stellen, enzovoort.

Voor beslissingen die betrekking hebben op het deel ten laste van de andere partijen, zal de leidend ambtenaar voorafgaandelijk aan zijn beslissing, advies vragen aan de andere partij. Indien er geen tegenstrijdigheden kunnen uit voortvloeien is dit advies bindend. In elk geval dient dit advies te worden gegeven binnen een termijn die noodzakelijk is voor de vlotte voortgang van de werken.

De partijen dragen de volledige verantwoordelijkheid, ook financiële, voor onder meer het tijdig verlenen van dit advies.

§ 2 De aanbestedende overheid stelt overeenkomstig de overheidsopdrachtenwetgeving en de reglementering met betrekking tot de veiligheid op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, 1 gemeenschappelijke veiligheidscoördinator-verwezenlijking aan die, tijdens de fase van de verwezenlijking van de samengevoegde opdrachten, de veiligheidscoördinatie zal uitvoeren.

De aanstelling van de veiligheidscoördinator-verwezenlijking wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst afgesloten tussen en ondertekend door alle partijen en de veiligheidscoördinator-verwezenlijking (natuurlijke persoon).

Alle partijen zien er op toe dat de veiligheidscoördinator-verwezenlijking zijn/haar opdrachten, samenhangend met hun aandeel in de samengevoegde opdrachten, te allen tijde volledig en adequaat vervult, dat hij/zij betrokken wordt bij alle etappes van de verwezenlijking van het bouwwerk en dat hij/zij alle informatie krijgt welke nodig is voor de uitvoering van zijn/haar opdrachten.

Ook de aannemer aan wie de opdracht tot uitvoering zal gegund worden, zal hiertoe worden verplicht.

De aanbestedende overheid ziet er op toe dat de veiligheidscoördinator-verwezenlijking bij het einde van zijn/haar opdracht een exemplaar van het aangepaste veiligheidsplan, het coördinatiedagboek en het postinterventiedossier met betrekking tot de samengevoegde opdrachten overmaakt aan alle partijen.

De kosten verbonden aan de aanstelling en de uitvoering van de taken van de veiligheidscoördinator-verwezenlijking worden evenredig verdeeld tussen alle partijen overeenkomstig het aandeel van elk der partijen in de samengevoegde opdrachten, bepaald op basis van de eindafrekening van de opdracht.

ARTIKEL 8 - Toezicht

De aanbestedende overheid staat in voor het toezicht van alle werken en draagt daarvan de kosten.

De andere partijen mogen gemandateerde waarnemers aanstellen die de werken ten laste van haar mee mogen opvolgen. Deze gemandateerde waarnemers kunnen advies geven aan de toezichter en/of leidend ambtenaar. Dit advies is eveneens bindend tenzij er tegenstrijdigheden zouden kunnen uit voortvloeien.

De partijen dragen de volledige verantwoordelijkheid voor het advies dat deze gemandateerde waarnemers verstrekken en staan ook in voor de kosten hiervan.

ARTIKEL 9 - Wijziging tijdens de uitvoering

Indien de leidend ambtenaar tijdens de uitvoering een belangrijke wijziging van de opdracht of de plans voor het gedeelte ten laste van één of meerdere andere partijen noodzakelijk acht, wordt vóór de betekening aan de aannemer de goedkeuring van de betrokken partij(en) bekomen met de voorgestelde wijzigingen en verrekeningen.

ARTIKEL 10 - Geschillen

Kosten die voortvloeien uit geschillen met de aannemer of een derde, tijdens of ten gevolge van de werken, worden gedragen door de partij die de financiële verantwoordelijkheid ten laste neemt van het gedeelte der werken waarop het geschil betrekking heeft.

Wanneer het geschil betrekking heeft op een gedeelte der werken waarvoor meer dan één partij de financiële verantwoordelijkheid neemt, of in geval de financiële verantwoordelijkheid niet duidelijk kan omschreven worden, zullen deze kosten verdeeld worden over de partijen betrokken bij het geschil, naar verhouding van hun respectieve tussenkomst in de kosten van de werken.

Behoudens ingeval van een zware fout of nalatigheid vanwege de aanbestedende overheid, verbinden de andere partijen zich ertoe om, met betrekking tot de werken ten laste van hen, de aanbestedende overheid te vrijwaren en in alle geschillen vrijwillig tussen te komen. De aanbestedende overheid verstrekt alle inlichtingen ten behoeve van de gerechtelijke procedure.

ARTIKEL 11 - Betaling

§ 1 A rato van het aandeel van elk der partijen in de samengevoegde opdrachten wordt door de veiligheidscoördinator-ontwerp en de veiligheidscoördinator verwezenlijking een afzonderlijke factuur opgemaakt en verstuurd aan de respectievelijke partijen bij de aflevering van het veiligheidsplan, het coördinatiedagboek en het postinterventiedossier.

Indien één der partijen de betalingstermijnen niet naleeft en hierdoor verwijlinteressen of andere schadevergoedingen voortvloeien, zal de in gebreke gebleven partij de andere partij(en) volledig vrijwaren.

§ 2 De werken worden uitgevoerd deels voor rekening van de gemeente Nevele, deels voor rekening van de stad Deinze, deels voor rekening van de TMVW-zuivering Nevele, deels voor rekening van de TMVW-zuivering Deinze en deels voor rekening van de TMVW-zuivering Gent.

Per partij worden afzonderlijke betalingsaanvragen, vorderingsstaten en facturen opgemaakt.

De vorderingsstaten der uitgevoerde werken slaan op maandelijkse perioden, die vervallen op de datum van elke maand, welke overeenstemt met de datum bepaald in het bevel tot aanvang van de werken.

De vorderingsstaten en betalingsaanvragen, door de leidend ambtenaar nagezien, gedateerd en ondertekend voor "akkoord", worden door de aanbestedende overheid voor nazicht overgemaakt aan de andere partij.

Alle partijen beschikken over 20 kalenderdagen om de vorderingsstaten na te zien en/of eventueel te verbeteren.

Bij de eindafrekening wordt deze termijn op 45 kalenderdagen gebracht.

De al dan niet verbeterde betalingsaanvragen en vorderingsstaten worden ter goedkeuring aan de leidend ambtenaar voorgelegd.

De aanbestedende overheid stuurt binnen de 5 kalenderdagen de goedgekeurde betalingsbundel van de andere delen terug naar de andere partij en nodigt tezelfdertijd de aannemer uit om zijn factuur in te dienen bij de andere partij.

Ingeval door één van de partijen deze termijnen niet gerespecteerd worden en hierdoor verwijlintresten of andere schadevergoedingen voortvloeien, zal de ingebreke gebleven partij de andere partij volledig vrijwaren.

Alle partijen zullen instaan voor de betaling aan de aannemer binnen de termijn voorzien in artikel 15 van het KB van 26 september 1996 en verbinden zich ertoe de vereiste maatregelen te nemen en te beschikken over de nodige kredieten voor de betaling van hun respectievelijk aandeel.

Elke partij betaalt zijn deel van de uitgevoerde werken rechtstreeks aan de aannemer.

In geval van laattijdige betaling door één van de partijen staan deze in voor de daaruit voortvloeiende verwijlintresten en andere schadevergoedingen en zullen deze de aanbestedende overheid volledig vrijwaren.

ARTIKEL 12 - Boetes en kortingen wegens minwaarde

De boetes en/of kortingen wegens minwaarde die duidelijk overeenstemmen met een bepaald aandeel, komen ten goede aan de betrokken partij. De andere boetes (van algemene aard) en/of kortingen wegens minwaarde die niet onmiddellijk toewijsbaar zijn aan een bepaald deel, worden pro rata van de inschrijvingsbedragen voor de verschillende delen verdeeld over de verschillende partijen.

ARTIKEL 13 - Voorlopige en definitieve oplevering. Vrijgave borgtocht.

Aangezien het één globale aanneming betreft, wordt de voorlopige en definitieve oplevering verleend voor gans de aanneming, dus voor alle delen samen. De voorlopige en definitieve oplevering wordt door de leidend ambtenaar gegeven.

De vrijgave van de borgtocht heeft betrekking op de ganse aanneming.

De processen-verbaal van voorlopige en definitieve oplevering worden door de leidend ambtenaar opgesteld en een afschrift wordt overgemaakt aan alle betrokken partijen.

Voor het plaatsbezoek met het oog op de oplevering dienen alle betrokken partijen tijdig en regelmatig uitgenodigd te worden. Iedere partij dient aldus de mogelijkheid geboden te worden om, tegensprekelijk, zijn opmerkingen te formuleren en desnoods te laten opnemen in het proces-verbaal van oplevering.

Indien de partijen oordelen dat de werken niet opgeleverd kunnen worden geven zij hierover een duidelijke motivatie. De leidend ambtenaar beslist, zoals beschreven in artikel 6.

ARTIKEL 14 - Schadegevallen

Tijdens de waarborgperiode zullen de andere partijen de aanbestedende overheid elk schadegeval ten gevolge van eventuele gebrekkige uitvoering aan de weg- en rioleringsinfrastructuur rapporteren. De aanbestedende overheid zal vervolgens met de aannemers de nodige contacten nemen in verband met de herstellingswerken.

ARTIKEL 15 - Beheer en onderhoud

Alle partijen verklaren zich akkoord om, vanaf de voorlopige oplevering van de werken door de aannemer, het beheer en het onderhoud van de wegenis, rioolkolken, dienstrioleringen en huis- en kolkaansluitingen, opgenomen in hun aandeel in de werken, te hunnen laste te nemen.

Voor TMVW: de rioolkolken, dienstrioleringen en huis- en kolkaansluitingen

Voor Nevele: wegenis op haar grondgebied

Voor Deinze: wegenis op haar grondgebied

Voor Gent: wegenis op haar grondgebied

Opgemaakt in viervoud te Gent op

Voor TMVW,

Ludy MODDERIE
algemeen directeur

Martine DE REGGE
voorzitter

Voor de gemeente Nevele,

Joke Mertens
gemeentesecretaris



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

de burgemeester,
J. Cornelis

Voor de stad Deinze,

de gemeentesecretaris,
S. De Vlieger

de burgemeester,
J. Vermeulen


Voor de stad Gent,

de gemeentesecretaris,
P. Teerlinck

de burgemeester,
D. Termont



Adres 9031 Moerstraat
9031 Moerstraat

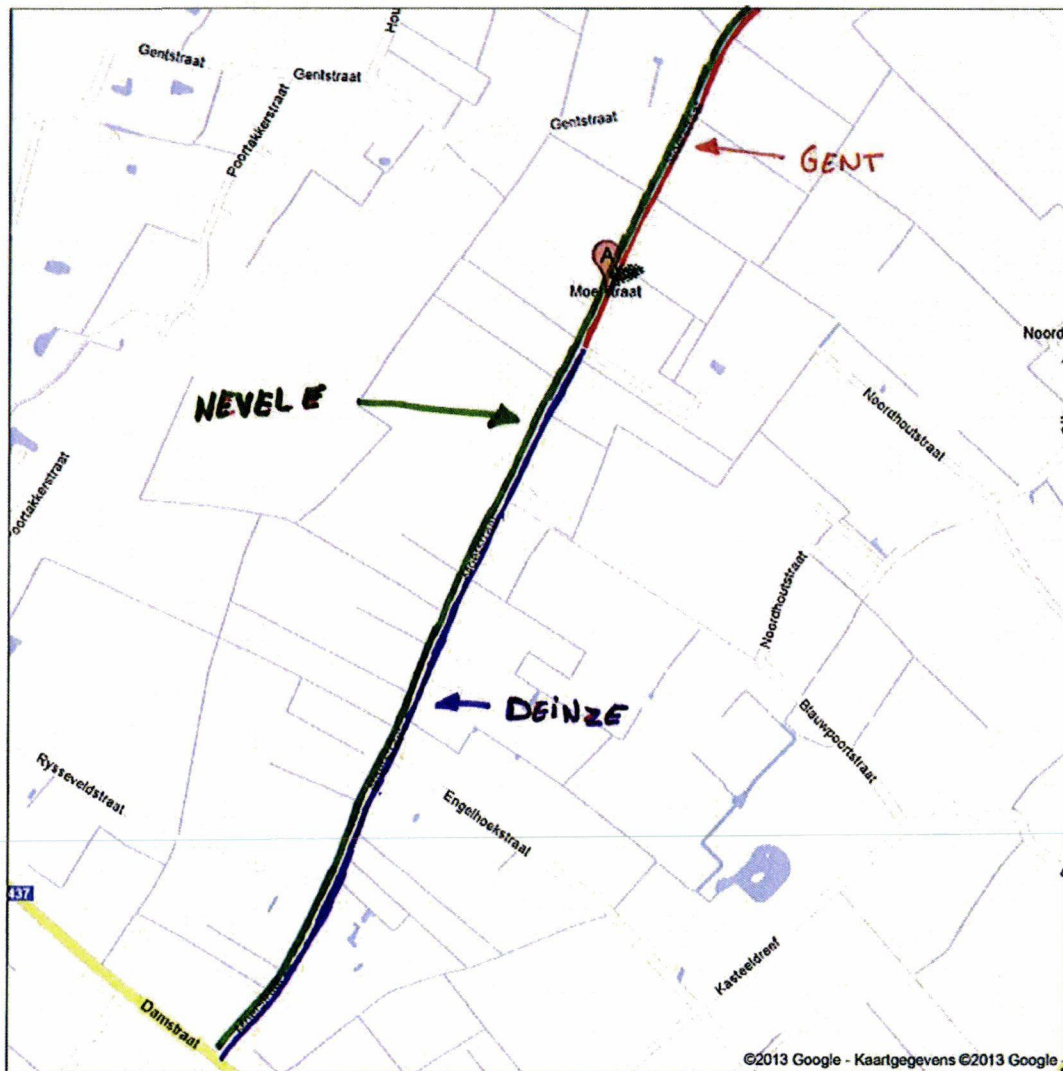

STEMMING

Aangenomen door de gemeenteraad in openbare vergadering van 25 april 2016:

- Met unanimititeit
-
